

年产 30000 吨导轨材料项目

水土保持方案报告表

建设单位：安徽亚磊精密材料有限公司

编制单位：宣城禾美环保技术有限公司

2022 年 8 月

年产 30000 吨导轨材料项目 水土保持方案报告表

项目名称： 年产 30000 吨导轨材料项目

建设单位： 安徽亚磊精密材料有限公司

法定代表人： 梁子夫

单位地址： 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区云台路与锦城东路交汇处

联系人： 梁子夫

联系电话： 13656617888

年产 30000 吨导轨材料项目

水土保持方案报告表

责任页

(宣城禾美环保技术有限公司)

批 准： 张有胜

核 定： 高祥

审 查： 丁静

校 核： 葛芳芳

项目负责人： 景为

编 写： 景为

年产 30000 吨导轨材料项目水土保持方案特性表

项目概况	位置		安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区云台路与锦城东路交汇处		
	建设内容		本项目建筑面积 37600 平方米，新建 1#车间、2#车间、污水处理操作间、办公楼、1#综合楼及附属建筑；购置轧头燃气炉、抛丸机、天然气锅炉、磷化/皂化生产线、直条拉拔机、燃气退火炉、燃气回火炉、四连冷轧机组、矫直机、矫扭机、感应淬火炉、钻孔中心、浸油池、CK6155E 型数控车床、污水处理设施等设备；年产导轨材料 30000 吨。		
	建设性质		新建	总投资（万元）	19145.09
	土建投资（万元）	4650	占地面积（hm ² ）	永久占地	6.0698
				临时占地	0.0741
				总计	6.1439
	动工时间		2022 年 4 月	完工时间	2023 年 3 月
	土石方（万 m ³ ）	挖方	填方	借方	余方
		2.4288	2.4288	/	/
取土（石、砂）场	无				
弃土（石、砂）场	无				
项目区概况	涉及重点防治区情况		不涉及	地貌类型	江淮丘陵区
	原地貌土壤侵蚀模数 [t/（km ² ·a）]		450	容许土壤流失量 [t/（km ² ·a）]	500
项目选（线）水土保持评价	工程不在国家及省级的重点预防区和治理区的范围内；工程不占用水土保持监测站点、试验站和观测站等设施；本项目地点也不在崩塌滑坡危险区，不涉及泥石流易发区和易引起严重水土流失和生态恶化区。 工程区不涉及自然保护区、水功能保护区、重要湿地生态敏感区，不存在生态敏感区等的保护问题。 从水土保持角度分析，项目选址可行。				
预测土壤流失量		本工程建设可能造成水土流失总量为 220.03t			
防治责任范围（hm ² ）		6.1439			
防治标准等级及目标	防治标准等级		南方红壤区一级标准		
	水土流失总治理度（%）		98	土壤流失控制比	1.10
	渣土防护率（%）		98	表土保护率（%）	/
	林草植被恢复率（%）		98	林草覆盖率（%）	5
水土保持措施	主体工程区	工程措施：新建排水管 3988m；累计土地整治；0.6389hm ² ； 植物措施：主体工程内设置景观绿化面积 0.4856hm ² ； 临时措施：临时堆土彩条布苫盖 0.08m ² ；临时堆土场周边布设 426m 的临时排水沟；布设沉沙池 1 座。			
	施工临建区	工程措施：土地整治：本项目在施工后期对施工临建区未硬化部分拆除临建设施后实施土地整治，土地整治面积为 0.1263hm ² 。 临时措施：本项目施工临建区未硬化部分暂未计划建设，在施工后期对施工临建区土地整治后播撒草籽，面积为 0.1263hm ² 。			
水土保持投资（万元）	工程措施		66.65	植物措施	36.42
	临时措施		1.35	水土保持补偿费（万元）	4.91512
	独立费用	建设管理费		0	
		水土保持设施验收费		2	
		水土保持方案编制费		3	
总投资		114.33512			
编制单位	宣城禾美环保技术有限公司		建设单位	安徽亚磊精密材料有限公司	
法人代表及电话	徐建		法人代表及电话	梁子夫	
地址	安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区麒麟大道 11 号		地址	安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区云台路与锦城东路交汇处	
邮编	242000		邮编	242100	
联系人及电话	张有胜 15956269212		联系人及电话	梁子夫 13656617888	
电子邮箱	/		电子邮箱	/	
传真	/		传真	/	

年产 30000 吨导轨材料项目
水土保持方案报告表编制说明

建设单位：安徽亚磊精密材料有限公司

编制单位：宣城禾美环保技术有限公司

2022 年 8 月

目录

1 项目概况	1
1.1 项目基本情况	1
1.2 项目建设规模及主要经济指标	3
1.3 项目区现状	3
1.4 设计水平年	4
1.5 项目组成及布置	5
1.6 施工组织	8
1.7 工程占地	9
1.8 土石方工程	10
1.9 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	12
1.10 施工进度	12
1.11 自然概况	12
2 防治目标与防治责任范围	15
2.1 水土流失防治目标	15
2.2 水土流失防治责任范围	16
3 水土保持评价	18
3.1 主体工程选址（线）评价	18
3.2 建设方案与布局评价	19
3.3 取土（石、砂）场设置评价	20
3.4 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价	20
3.5 施工方法与工艺评价	20
3.6 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价	21
3.7 主体工程设计中水土保持措施界定	23
4 水土流失分析与预测	24
4.1 调查及预测单元和时段	24
4.2 土壤流失量的调查与预测	25
4.3 水土流失危害分析	27
5 水土保持措施	29

5.1 防治分区划分	29
5.2 水土保持工程级别与设计标准	30
5.3 水土保持措施布设成果	30
5.4 分区防治措施布设	31
5.5 水土保持措施施工进度安排	32
6 投资概算与效益分析	34
6.1 投资概算	34
6.2 效益分析	37
7 水土保持工程管理	39
7.1 组织管理	39
7.2 后续设计	39
7.3 水土保持监测	39
7.4 水土保持监理	39
7.5 水土保持施工	39
7.6 水土保持验收	39

附件：

- 1、委托书
- 2、项目立项文件
- 3、不动产权证
- 4、建设工程规划许可证
- 5、建设工程施工许可证
- 6、安徽郎溪经济开发区区域评估水土保持方案报告书批复文件

附图：

- 附图 1 总平面布置图
- 附图 2 项目分期建设图
- 附图 3 项目区土壤侵蚀强度分布图
- 附图 4 防治责任范围及分区防治措施布设图
- 附图 5 水土保持措施典型布设图
- 附图 6 项目水系图
- 附图 7 雨水总平面图

1 项目概况

1.1 项目基本情况

项目名称：年产 30000 吨导轨材料项目。

建设单位：安徽亚磊精密材料有限公司。

建设地点：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区云台路与锦城东路交汇处
(中心坐标：119° 13' 5.34" ,31° 12' 24.224")。

建设规模：本项目为一期项目，新建 1#车间、2#车间、污水处理操作间、办公楼、1#综合楼及附属建筑；购置轧头燃气炉、抛丸机、天然气锅炉、磷化/皂化生产线、直条拉拔机、燃气退火炉、燃气回火炉、四连冷轧机组、矫直机、矫扭机、感应淬火炉、钻孔中心、浸油池、CK6155E 型数控车床、污水处理设施等设备；年产导轨材料 30000 吨。

项目二期计划建设 3#车间、2#综合楼，三期计划建设 4#车间，四期计划建设 3#综合楼。

本次水土保持方案内容包括项目一期（实际建设范围）、2#车间（二期，未建设，作为施工临建区）、3#综合楼（四期，未建设，但涉及地表扰动）、4#车间南部地块。详见附图 2 项目分期建设图

3#车间（二期）、4#车间（三期）位于厂区西北角，本次方案未计划建设，并且未造成地表扰动，未纳入本次方案。建设单位建设前需另行履行水土保持相关手续。

项目性质：新建

项目占地：本项目占地面积为 6.1439hm²，包括永久占地面积 6.0698hm²，施工出入口临时占地面积 0.0741hm²，均为工业用地。

土石方：项目区建设期间土石方挖填总量为 4.0576 万 m³，其中挖方总量为 2.4288 万 m³；填方总量为 2.4288 万 m³，无借方，无弃方。

项目投资：工程总投资 19145.09 万元，其中土建投资 4650 万元。全部由企业自筹。

项目时段：项目已于 2022 年 4 月开工，预计于 2023 年 3 月完工，总工期 12 个月。

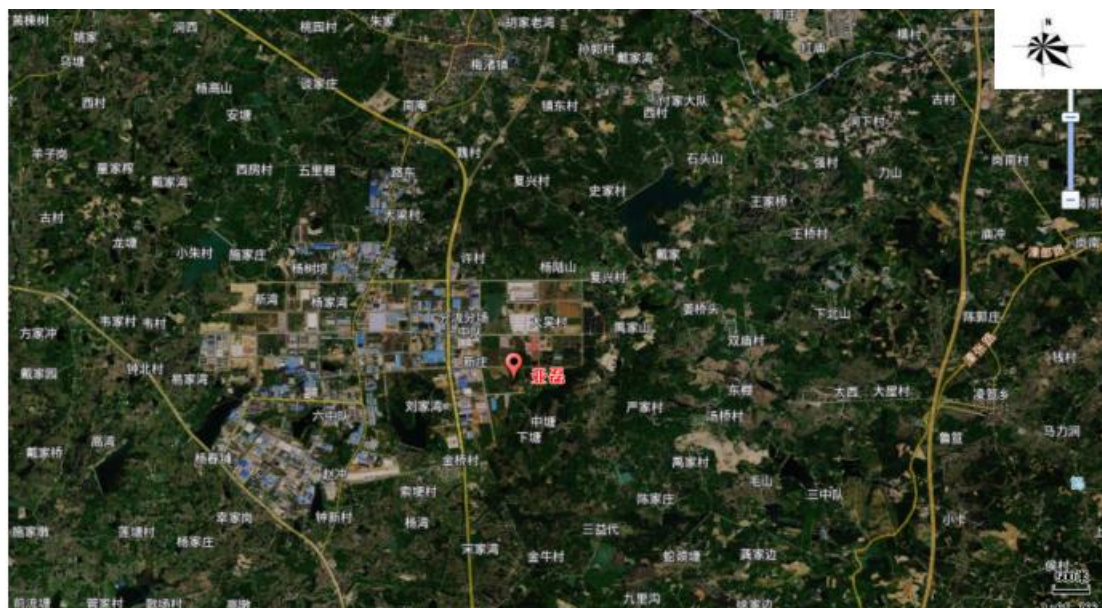


图 1.1-1 项目区地理位置

前期工作进展情况：

2021 年 9 月 14 日，安徽亚磊精密材料有限公司年产 30000 吨导轨材料项目经郎溪县发展和改革委员会审批通过，项目代码：2109-341821-04-01-583846；

2021 年 9 月 22 日，化工部马鞍山地质工程勘察院完成该项目岩土工程勘察报告；

2022 年 3 月，铭扬工程设计集团有限公司完成本项目规划设计方案；

2022 年 3 月，铭扬工程设计集团有限公司完成本项目施工图设计；

2022 年 4 月 22 日，安徽亚磊精密材料有限公司取得本项目建设工程规划许可证；

2022 年 4 月 29 日，安徽亚磊精密材料有限公司取得本项目建设工程施工许可证；

本项目已于 2022 年 4 月开工建设，计划于 2023 年 3 月完工，总工期 12 个月。

2022 年 8 月，安徽亚磊精密材料有限公司委托我公司承担该项目水土保持方案报告表的编制工作。接受委托后，我公司成立了项目组，对工程所在地进行全面勘察，搜集了工程相关资料，多次与各相关单位沟通，于 2022 年 8 月编制完成了《年产 30000 吨导轨材料项目水土保持方案报告表》。

1.2 项目建设规模及主要经济指标

本项目规划总用地面积 60698m²，项目总建筑面积 36308.11m²。项目主要经济技术指标见表 1.2-1

表 1.2-1 主要经济技术指标

序号	项目	单位	计算数量	备注
1	规划总用地	m ²	60698	60698hm ²
2	总建筑占地面积	m ²	26962.67	
3	总建筑面积	m ²	36308.11	
其中	1#车间	m ²	3760.79	一层
	2#车间	m ²	18094.15	一层
	5#车间	m ²	1477.67	四层
	1#综合楼	m ²	3709.58	五层
	污水处理操作间	m ²	3967.45	一层
	宿舍楼	m ²	4119.63	五层
	研发楼	m ²	374.27	二层
	打卡房	m ²	38.94	一层
	辅助用房	m ²	394.62	一层
	配电房	m ²	72.02	一层
	泵房水池	m ²	167.18	一层
	1#传达室	m ²	58.43	一层
	2#传达室	m ²	73.38	一层
4	计容积率总建筑面积	m ²	59524.54	
5	建筑密度	%	44.4	
6	机动停车位	个	136	
7	绿地率	%	8	

1.3 项目区现状

本项目已于 2022 年 4 月开工，预计 2023 年 3 月完工；本项目位于宣城市郎溪县经济开发区，西侧、北侧为工业空地，南侧为锦城东路，东侧为云台路（待建）。项目已开工建设，目前已完成 1#车间的建设，5 车间正在建设中，2#车间、污水处理池、宿舍楼正在进行基础施工。厂区现状见下图 1.3-1。

本项目存在水土保持不到位的情况，但未发生水土流失危害性事件，本方案采取了设置了一座临时堆土场，采用彩条布苫盖覆盖，布设沉沙池 1 座等临时措施减少水土流失。



图 1.3-1 项目区现状图

1.4 设计水平年

水土保持设计水平年指水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的年份。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，水土保持方案设计水平年应为工程完工的当年或后一年。主体工程已于 2022 年 4 月开工，2023 年 3 月完工，总工期 12 个月。建设类项目的方案设计水平年为主体工程竣工的

当年或后一年，确定本项目水土保持方案设计水平年为 2023 年。

1.5 项目组成及布置

项目建设内容包括：1#车间、2#车间、污水处理操作间、办公楼、1#综合楼等；同时配套建设厂内道路、给排水、绿化、停车位等配套设施。

1、建筑物

本项目共 12 栋地上建筑：1#车间、2#车间、5#车间、污水处理操作间、宿舍楼、1#综合楼、研发楼、打卡房、辅助用房、配电房、1#传达室、2#传达室。所有建筑均为框架结构。

本项目有 2 栋地下建筑：泵房水池、污水处理池。

2、附属设施

(1) 厂区道路

厂区设道路呈环形布置，长度约 1600m（不包括二期 620m 道路）。所有道路的转弯半径均大于 9 米，道路净宽均大于 4 米，厂区道路采用 200 厚 C30 砼+100 厚水泥稳定碎石垫层(5%)+600 厚矿渣压实+素土压实路基。

(2) 排水管网

本工程采用有组织排水，经室外雨水口收集后通过厂区雨水管网排入室外市政雨水管网。主体工程设计在道路两侧布设排水管道，排导项目区内的汇水。采用钢筋混凝土圆管，环刚度为 SN8；雨水管径 DN300、DN400、DN500，雨水口连接管管径 DN225、DN300。

厂区内铺设雨水管网约 3988m（仅包含本次项目防治责任范围，3#、4#车间本次项目未计划建设，其雨水管网 940m 未计入），设置雨水口 115 处。

设计暴雨重现期为 2 年地块综合径流系数为 0.70。地面集流时间 t_1 采用 15min，本工程暴雨强度公式为： $q=2632.104(1+0.6071\lg p)/(t+11.604)^{0.769}$ ，设计降雨历时 $t=t_1+t_2(\text{min})$ 。

(3) 绿化

项目在工程设计过程中，坚持“绿化美化和防止污染相结合”的原则，充分利用项目区域的闲置空地和厂区道路两侧的空闲区域，种植树木、花草，用于绿化环境。厂区绿化面积 0.4856hm²。

(4) 供电

从附近变电站降压后送至厂内各建筑，厂区内所有电力电缆均采用直埋方式

沿路敷设，埋深一般不得低于 0.7 米。电力管线与其它管线的水平净距不小于 1 米。所有 10KV 电缆管线采用埋地排管敷设的方式，另外考虑分路段管线较多的情况，局部结合采用电缆沟、管材选择加强型 PVC 双壁波纹电气专用管，考虑到穿越道路时的机械强度问题，可以局部穿镀锌钢管。

低压电线管线干线采用镀锌钢管沿墙或地板敷设，支线部分采用 PC 管沿墙或地板敷设。

（5）供水

本工程供水系统从附近市政给水管网引入 1 根给水干管，给水管网在厂区内成枝状供水，消防给水系统引入管管径 DN100，其他工业生产给水系统用水量根据工艺要求确定引入管管径。

3、竖向布置

现场地地表总体较为平缓，原地貌高程为 20.4m~27.8m。勘察期间场地已由郎溪经济开发区管委会安排，经过人工挖填整平，现状地表高程 22.2~23.9m，整体向南微倾。场地预计整平高程 22.2m。规划充分利用区域的地形地貌及周边环境，采用平坡式布置，因坡就势合理布局道路、建筑，使之能顺畅地排除地表水。室外设计高程与相邻道路平顺衔接，主要以项目区车行道为汇水线，室外场地坡度大于 0.1%，场地设计高程（22.5m）高于周边道路（锦城东路 21.5m-21.9m，云台路 20.7m），建筑内标高（22.65m-23.10m）均高于室外场地（22.5m）。

4、总平面布置

项目位于郎溪经济开发区，永久占地面积 6.0698hm²。

1#车间位于厂区的西南角，2#车间位于厂区的中部东侧。办公楼位于厂区南侧，宿舍楼和研发楼位于厂区的东南角，综合楼位于宿舍楼北侧，传达室位于厂区的南侧中部。



1.6 施工组织

施工生产生活区：本项目占地全部为永久占地，施工临建区设置在 2#车间（二期，未建设）以及 1#车间北部（已硬化），部分施工材料临时堆放在红线范围内。后期建设完成后拆除临建设施，2#车间由于未建设，计划播撒草籽作为临时措施。

施工道路：项目区外主要利用现有道路锦城东路、大闸路等，附近有省道 S203、国道 G235，因此无需新增施工道路。

施工用水、用电：工程用水、用电均来自于附近市政水电，无需新建临建设施。

施工材料：项目位于郎溪经济开发区，工程所需要的施工材料就近购买。

临时堆土区：根据工程施工资料，本项目仅基坑开挖会产生少量土方，需临时堆放。本项目设置一个临时堆土区位于 2#车间南部，面积约 600m²，堆放高度不得超过 2m，坡度小于 1:2。临时堆土场地应采取挡护措施，避免造成水土流失。

取、弃土场：本项目土石方就地挖填平衡，对外无废弃，因此项目不设置取、弃土场。

施工方法与工艺：

1、土方工程施工

1) 土方开挖

土方开挖采用 1m³挖掘机挖土，为避免扰动地基土，最后预留 30cm 人工开挖，胶轮车运输。开挖土方中质量较好的土料掺上营养土用于后期土地整治，其余土用于基础回填和地面垫高。

2) 土方回填

建筑物周围土方需在混凝土浇筑完成并达到要求的强度后开始施工，回填土方，主要利用原开挖后的可利用土方，土方回填采用机械摊铺，振动碾，平板振动夯夯实，建筑物周围 2m 范围内以人工摊铺，辅以蛙式打夯机夯实，回填土料分层厚度不大于 30cm。

2、建筑物基础施工方法与工艺

厂区建筑采用钢筋混凝土独立基础加基础梁。建筑物基础开挖至设计高程

后，铺填砂石，经机械碾压，浇筑混凝土垫层，然后铺设绑扎钢筋网，再浇筑混凝土。

3、内部道路施工工艺

道路路基填筑施工采用机械施工为主，适当配合人工施工的方案。填筑时配置符合要求的压实机械，严格控制含水量，尤其是梅雨季节，严禁使用超规定含水量填料，做到分层压实，控制有效压实厚度，不得超厚压实，填筑料夯实至路基顶面。路面工程采用配套路面施工机械设备，专业化施工方案，配置少量的人工辅助施工。严格控制材料级配和数量，做好现场监理与工序监测，在不满足规定气温要求的条件下不准施工。

4、管线施工

管线工程包含排水管、进水管、雨水管、讯号线与电线安装工程。管线工程结合道路布设，其施工也与道路施工相结合。管线工程基础开挖采用机械与人工相结合方式，开挖的土方暂时放至沟边，预埋的管道临时运至沟边，开挖的沟槽经验收合格立即安装管道，按要求回填，减少堆土的裸露时间。

5、绿化工程

在道路、主要建、构筑物完成之后，即进行绿化工作，由机械和人工结合，对规划绿地进行场地清理、回填表土和微地形平整后，采用乔灌木和草分层搭配种植，其中，乔灌木采用穴植方式，种草采用撒播方式，品种尽量选用本地适生树种和景观树种。

1.7 工程占地

项目总占地面积 6.1439hm^2 ，包括主体工程区和施工临建区。

(1) 主体工程区

项目总占地面积 6.1439hm^2 ，包括车间、绿化区域、道路及硬化区域以及施工出入口临时占地区域。

建筑包括：1#车间、2#车间、5#车间等，占地面积约 2.6963hm^2 ，总建筑面积约 3.63hm^2 。

绿化区域为厂区内绿化，占地面积 0.4856hm^2 。

道路及硬化区域包括厂区内道路及建筑物周边硬化，占地面积 2.8879hm^2 。

施工出入口临时占地约 0.0741hm^2 ，位于厂区南侧侧与锦城东路相邻处共计 2 个出入口以及厂区东侧 1#综合楼北部与云台路相接处。详见附图 4 防治责任范

围及分区防治措施布设图。待本项目建设完成，将锦城东路西侧出入口处按厂区道路标准施工，作为厂区主要入口，其余作为次要出入口。

(2) 施工临建区

经现场调查，项目目前正在建设中，设置施工临建区位于占地红线内，面积约 0.1533hm²，用于办公、堆放施工材料等用途。其中已硬化区域面积 0.0027hm²，后期拆除临建设施；未硬化区域面积 0.1263hm²，后期进行土地整治并播撒草籽。位置详见附图 4 水土保持措施图。

表 1.7-1 工程占地性质、类型、面积表 单位：hm²

工程分区		面积	占地类型	占地性质	
			工业用地	永久	临时
主体工程区	建筑	2.6963	2.6963	2.6963	0
	绿化	0.4856	0.4856	0.4856	0
	道路及硬化区域	2.8087	2.8087	2.7346	0.0741
施工临建区		0.1533	0.1533	0.1533	0
合计		6.1439	6.1439	6.0698	0.0741

1.8 土石方工程

1.8.1 表土平衡

根据现场调查并咨询建设单位，项目位于安徽省郎溪县经济开发区，项目建设时，政府已完成园区的“三通一平”工作，因此，项目无表土剥离。

1.8.2 土石方平衡

(1) 建筑物基础土石方

本项目已于 2022 年 4 月开工建设，经建设单位了解并结合地勘报告资料分析，项目地质条件较稳定。

地上建筑占地面积约 2.6963hm²，根据施工资料，地上建筑基础挖方土方开挖量为 0.8 万 m³，填方 0.6 万 m³。

地下建筑占地面积约 0.1028hm²，包括泵房水池和污水处理池。其中泵房水池占地面积 0.0116hm²，平均挖深 4m，挖方量 0.0464 万 m³，回填土方 0.0232 万 m³。污水处理池 0.0912hm²，平均挖深 2m，挖方量 0.1824 万 m³，回填土方 0.0912 万 m³。地下建筑合计挖方 0.2288 万 m³，填方 0.1144 万 m³。

建筑物基础土方合计挖方 1.0288 万 m³，填方 0.7644 万 m³。多余土方用于厂区垫高以及管线回填。

(2) 场平工程

该区域原始地形高程介于 20.4m~27.8m 之间，勘察期间场地已由园区完成三通一平，此次场平工程土石方不计入本次水土保持方案。现状地表高程 22.2~23.9m，建筑物设计标高 22.65-23.10m，厂区道路设计标高 22.50m。项目开工前需进行第二次场地平整，场地预计平整高程为 22.2m，预计垫高后道路广场达到 22.5m 的高程。本次场平工程预计挖方 0.8 万 m³，填方 0.6 万 m³，项目多余土方暂存于临时堆土区，用于土地整治及厂区垫高。

(3) 管线工程

包括给水、雨水、污水、电力和通信，项目区内管线沿道路布设。管线工程包括给水、雨水、污水、电力、通信和燃气管道，项目区内管线沿道路布设。路基填筑时同步进行管线埋设施工，管线工程开挖后应及时铺设、及时回填土方并压实，管线长度 3500m，开挖沟深 1.5m，底宽 0.5m，边坡 1: 0.5 的梯形断面，工程开挖量 0.6 万 m³，填筑量 0.6 万 m³，多余土方就地铺平在场地周边，无借方和弃方。

表 1.8-1 项目土石方平衡汇总表 单位万 m³

项目分区			挖方	填方	调入		调出		借方		弃(余)方	
					数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
主体工程区	①	建筑物基础土石方	1.0288	0.7644			0.2644	③				
	②	场平工程	0.8	0.6			0.2	③				
	③	厂区垫高	0	0.4644	0.4644	①②						
	④	管线工程	0.6	0.6								
总计			2.4288	2.4288	0.4644		0.4644					

注：表中土方均为自然方，与实方比例为 1.3，松方与自然方的系数取 1.5，单位为万 m³。

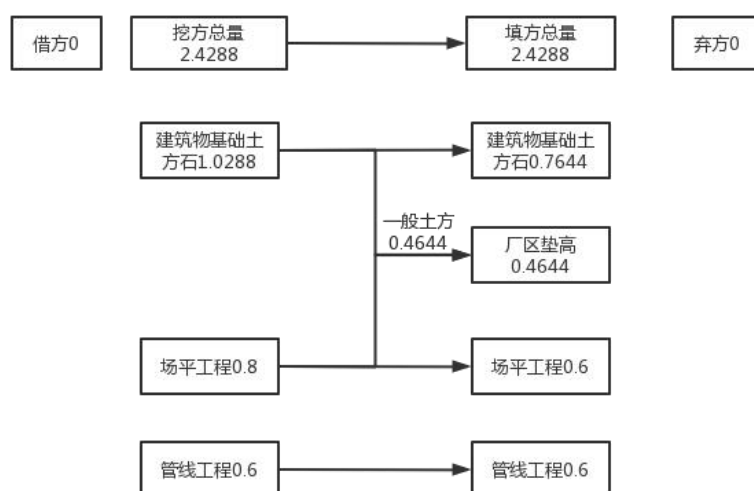


图 1.8-1 项目土石方平衡流向图 单位万 m³

1.9 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

1.10 施工进度

本项目已于 2022 年 4 月开工，预计于 2023 年 3 月完工，总工期 12 个月。

1.11 自然概况

地质地貌：郎溪是皖南东部的边陲县，位于安徽省沿江平原与皖南山区的结合部，郎溪县境内地貌比较复杂，北部和中部沿郎川河主、支流和南漪湖东岸以平原为主，南部和东部边缘为起伏岗、丘和低山。

本区所处大地构造位置为扬子准地台（Ⅲ）～下扬子台拗（Ⅲ2）～皖南陷褶断带（Ⅲ23）～黄山凹褶断束（Ⅲ23-1）的东北端，区域构造主要由伍员山拗陷、郎溪拗陷部分组成，形成了以北北东～北东向构造方向为主，北西和东西向为辅的拗皱断裂带；后者以拗陷盆地为主，本场地处于郎溪拗陷盆地北。

区域地层属扬子地层区江南地层分区，常州、宣城地层小区，县城及周边基岩地层以侏罗系上统大王山组流纹岩、粗安岩及白垩系上统宣南组红砂岩为主，上覆第四系粉砂质亚粘土、粘土、砂、夹灰色砂岩砾石等。

场地无大断裂构造通过，地层岩性稳定，适宜建设。

根据项目岩土工程勘察报告，场地可分 3 个工程地质层，自上而下依次描述如下：

①层：杂填土（Q4ml）

暗黄色，松散，湿。主要成分为粉质粘土，夹碎石、植物碎片。原池塘部位该层底部为灰黑色淤泥，流塑、饱和。该层为新近堆积层，堆填时未经压实处理，属欠固结土。该地层层底坡度一般小于 0.2。

②层：粉质粘土（Q4al）

暗黄色，软塑~可塑，干强度中等，中等韧性，摇振反应无，刀切面稍有光泽。主要成分为粉质粘土，夹灰白色粘性土状条带。

③层：粉质粘土（Q3al）

黄色，可塑~硬塑，干强度中等，中等韧性，摇振反应无，刀切面稍有光泽。主要成分为粉质粘土，夹灰白色粘性土状条带，含铁锰结核。

根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016 年版的规定，郎溪县建平镇的抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分组为第一组，本工程建筑抗震设防类别为标准设防类（丙类），工程重要性等级为二级。

气象：郎溪县属于亚热带季风湿润气候，降水季节性强，雨量丰沛且集中，气候温和，无霜期长，光照充足，季风显著等特点。根据郎溪县气象站 1961-2019 年 58 年（1983 年 7 月阴洪水入城缺测，该年不计入统计）数据，多年平均气温 16.3℃，极端最高气温为 40.3℃，最低气温为 -16.0℃。根据郎溪县气象站 1961-2013 年共 53 年观测资料，本地区年平均蒸发量为 1440.1mm；根据郎溪气象站 1952-2019 年共 66 年（其中 1958，1959 年缺测）观测资料统计，该站所在地郎溪县城多年平均年降水量为 1232.0mm，最大年降水量为 2356.3mm，最小年降水量为 1978 年的 695.0mm，降水的年际变化较大，多年平均年降水日数为 133d，最多年 166 天（1954 年），最少年 100 天（1978 年）。本区域多年平均无霜期（1971~2000 年）为 236d。根据郎溪县气象站 1961-2019 年 58 年（1983 年 7 月阴洪水入城缺测，该年不计入统计）观测资料统计，年平均风速为 2.9m/s，相当于 2 级风，最大风速 22m/s，方向为 NE。本地区降水的年内分配很不均匀，春季（3-5 月）平均降水量为 340.8mm，占年平均降水量 27.7%，夏季（6-8 月）降水量为 503.1mm，占年平均降水量 40.8%，是一年中降水最多的季节，秋季（9-11 月）降水量 223.2mm，占年平均降水 18.1%，冬季（12-2 月）降水量 155mm，占年平均降水量 12.6%，是一年中降水最少的季节。

水文：郎川河全长 108.5 公里，总流域面积 538 平方公里。上游有无量溪及

桐汭水两支，无量溪较长，一般以为正源，则郎川河发源于广德市东南境内的牛山，大致自南向北流经广德、郎溪二县，在郎溪县涛城镇汇合为郎川河，转向西流，入南漪湖（南湖）。郎川河的一级支流有无量溪、桐汭河、钟桥河、赤山溪，二级支流钟桥河的禹水与九道河，桐汭河主要支流花鼓河，无量溪主要支流粮长河等。

离项目区最近的水系为梅丰水库、郎宁水库、大闸水库以及钟桥河。钟桥河是郎川河在郎溪县境内的最大支流，全长 28 公里，流域面积 225 平方公里，发源于伍牙山，源头有两支，南支称禹水，北支称九道河。两支于汤桥村附近汇合后始称钟桥河。西南流经钟桥、吴家村、三岔等地，在吼儿桥入郎川河，流域区有岗南、凌笪、钟桥、建平、东夏 5 个乡镇。与郎川河汇合后发育了广阔的河口汇合平原，是郎溪的粮油重要基地。项目区雨水经过区域内部雨水管网进入市政道路雨水管网，最终流入附近河流和水库。项目区周边水系情况见附图 6 项目区水系图。

土壤植被：郎溪县地貌多样性和地质岩性的复杂性导致土壤的形成和分布具有复杂性和多样性。土壤既有自然形成的地带性和区域性土壤，又有人为活动形成的耕作土壤。土壤资源种类繁多，境内共有红壤、黄棕壤、紫色土、石灰（岩）土、潮土和水稻土 6 个土类，12 个亚类，42 个土属，88 个土种。本项目位于郎溪经济开发区，目前土地已平整完毕，不涉及表土剥离。

郎溪县森林植被属中亚热带常绿阔叶林带，多为次生植被或人工植被，常见的以常绿阔叶、落叶阔叶混交或阔叶针叶混交林为主。在交通不便、人烟稀少的边远山区，尚保存有少数地带性植被群落，全县林草林草覆盖率约 35.06%。

2 防治目标与防治责任范围

2.1 水土流失防治目标

(1) 执行等级

项目位于宣城市郎溪县郎溪经济开发区，根据《全国水土保持规划（2016-2030 年）》（国函〔2015〕160 号）、《安徽省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（皖政秘〔2017〕94 号），项目区不属于国家、安徽省及宣城市划定的水土流失重点预防区和重点治理区范围内。根据《安徽省水功能区划》、《安徽省主体功能区规划》、《宣城市水土保持规划》（2018-2030）等相关资料，项目区亦不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区，自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等其他水土保持敏感区。但项目区位于城市区域，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的有关规定，项目水土流失防治执行南方红壤区一级标准。

(2) 基本目标

本工程水土保持方案应达到以下水土流失防治的基本目标：

1) 项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

2) 水土保持设施安全有效；

3) 水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；

4) 水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定。

(3) 目标修正

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的有关规定，水土流失防治目标需根据地区干旱程度、土壤侵蚀强度、地形地貌、是否位于城区及行业

标准要求等进行修正，具体如下：

1) 地区干旱程度：项目区属于湿润地区，水土流失治理度直接采用标准规定值。

2) 土壤侵蚀强度：本项目处于南方红壤区的轻度侵蚀区域，按《生产建设项目水土流失防治标准（GB/T50434-2018）》第 4.0.7 款的要求，即“土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于 1”，本次根据实际情况增加 0.2 后为 1.10。

3) 地形地貌：项目位于江淮丘陵，不涉及山区。

4) 是否涉及城区：项目位于郎溪县郎溪经济开发区内，渣土防护率提高 1%。

5) 开发区已完成三通一平现场，本项目原地貌为空地，没有可剥离表土，因此本项目不涉及表土保护率。

6) 林草覆盖率：由于本项目位于城市区域，林草覆盖率应提高 2 个百分点，但本项目为工业项目，属于对林草植被有限制的项目，根据主设，本项目绿化率为 8%，因此，本方案将林草覆盖率修正为 8%。

按以上原则修正后的水土流失防治标准指标值见表 2.1-1。

表 2.1-1 工程水土流失防治标准指标值表

防治目标	一级标准		按地区干旱程度修正	按土壤侵蚀强度修正	按地形地貌修正	按城区修正	按工程特性修正	采用标准	
	施工期	设计水平年						施工期	设计水平年
水土流失治理度（%）	/	98	/	/	/	/	/	/	98
土壤流失控制比	/	0.90	/	+0.2	/	/	/	/	1.1
渣土防护率（%）	95	97	/	/	/	+0.1	/	/	98
表土保护率（%）	92	92	/	/	/	/	/	/	/
林草植被恢复率（%）	/	98	/	/	/	/	/	/	98
林草覆盖率（%）	/	25	/	/	/	/	-17	/	8

2.2 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），本工程建设防治责任范围为主体工程区及施工临建区，总用地面积 6.1439hm²。

表 2.2-2 工程防治责任范围表 单位：hm²

防治分区	面积 (hm ²)	工程占地			占地类型
		永久占地	临时占地	合计	
主体工程区	5.9906	5.9165	0.0741	5.9906	工业用地
施工临建区	0.1533	0.1533	0	0.1533	工业用地
合计	6.1439	6.0698	0.0741	6.1439	/

3 水土保持评价

3.1 主体工程选址（线）评价

项目建设所在地位于宣城市郎溪县郎溪经济开发区，总占地面积为 6.1439hm²。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》以及《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)，对工程选址水土保持制约性因素逐条分析和评价，对照分析结果见表。

表 3.1-1 主体工程选址（线）符合性分析与评价表

依据名称	序号	规定	本项目情况	符合性评价
《中华人民共和国水土保持法》	1	第十八条水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等	项目区背景水土流失属微度，不属于水土流失严重、生态脆弱区域	符合
	2	第二十四条生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失		符合
《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》	1	第十八条生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失在水土流失重点预防区和重点治理区、城市规划区范围内，禁止新建破坏植被、损坏地貌等可能造成水土流失的露天采矿生产建设项目	项目区位于宣城市郎溪县郎溪经济开发区，不涉及水土流失重点预防区和重点治理区，防治标准设为南方红壤一级标准，优化施工工艺，通过布设临时沉砂池等设施，植被恢复与建设工程等级为 1 级。	符合
《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)	1	对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，应优化方案，减少工程占地和土方石量；截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级；宣布设雨洪集蓄、沉沙设施；提高植物措施标准，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点。		符合
	2	主体工程选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带	不涉及	符合
	3	主体工程选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站	不涉及	符合

从上表可以看出，从《生产建设项目水土保持技术标准》规定的主体工程的

约束性规定对工程进行评价，本项目不在河流两岸、湖泊及水库周边的植物保护带内；工程选址范围内无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站；

本项目防治标准设为南方红壤一级标准，优化施工工艺，通过布设临时沉砂池等设施，植被恢复与建设工程等级设为 1 级。通过上述措施保证项目建设可行。

3.2 建设方案与布局评价

3.2.1 建设方案评价

项目位于宣城市郎溪县郎溪经济开发区，绿化工程按照园林式绿化标准实施，注重了景观效果，充分体现了水土保持理念。

本工程总平面布置始终贯彻“安全、绿化、景观与建筑结合”的设计原则，在工艺方案最优化，建设方案最合理化的基础上，从各个方面提升区内的外观效果和使用品质，工程的平面布置遵循“集约用地、最大限度利用土地价值”的原则，在满足配套需要的前提下，尽量将建构筑物布置在原有占地范围内，减少占地，实现效益最大化。

因此，本工程建设基本符合相关规范的限制性规定，项目建设总体布局基本合理。

3.2.2 工程占地评价

本项目工程总占地面积 6.1439hm²，其中永久占地 6.0698hm²，施工出入口临时占地面积 0.0741hm²。从占地类型看，本项目占地均为工业建设用地，符合因地制宜、集约用地的原则，符合有关土地管理的政策法规的要求。从占地性质来看，本工程以永久占地为主，临时占地为施工出入口临时占地。根据主体工程设计，本工程施工后期将进行硬化，水土流失量较小。综上所述，从水土保持角度分析，本工程占地基本合理、可行，符合水土保持要求，施工期间施工单位应加强施工统筹管理，避免随意扩大占地范围和面积。遵循节约用地、减少扰动面积的原则。

综上，工程占地不存在水土保持制约性因素，基本符合水土保持要求。本工程充分考虑节约用地的原则，布设紧凑、科学、合理，充分达到少占地、少破坏土地的目的。

3.2.3 土石方平衡评价

(1) 表土资源的保护和利用分析

根据现场调查并咨询建设单位，项目位于安徽省郎溪经济开发区，项目建设时，政府已完成园区的“三通一平”工作，因此，项目无表土剥离。

(2) 土石方平衡分析

根据工程设计文件及项目施工情况，项目挖方 2.4288 万 m³（自然方，下同），填方 2.4288 万 m³，土石方就地挖填平衡，对外无废弃。

综上所述，工程土石方挖填利用基本合理，符合水土保持对生产建设项目的建设要求。

3.3 取土（石、砂）场设置评价

本项目建设不涉及取土场。

3.4 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目建设不涉及弃土场。

3.5 施工方法与工艺评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》的规定，施工方法与工艺是否满足技术标准的规定评价详见表 3.5-1。

表 3.5-1 施工方法和工艺评价表

序号	施工方法与工艺的要求	本工程	评价
1	应控制施工场地占地，避开植被良好的区域和基本农田区。	不涉及	满足要求
2	应合理安排施工，防止重复开挖和多次倒运，减少裸露时间和范围。	施工方式合理，挖填平衡，无重复开挖和土方倒运。	满足要求
3	在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有河渠、公路、铁路、居民点和其他重要基础设施时，宜设计渣石渡槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石导出。	不涉及	/
4	弃土、弃石、弃渣应分类堆放。	不涉及	/
5	外借土石方应优先考虑利用其它工程废弃的土（石、渣），外购土（石、料）应选择合规的料场。	不涉及	/
6	大型料场宜分台阶开采，控制开挖深度。爆破开挖应控制装药量和爆破范围。	不涉及	/
7	工程标段划分应考虑合理调配土石方，减少取土（石）方、弃土（石、渣）方和临时占地数量。	不涉及	/

从上表可以看出，从《生产建设项目水土保持技术标准》规定的工程施工方法与工艺的规定对本工程进行评价，工程施工采用以机械为主、人工为辅的施工

工艺，施工组织设计紧凑，以缩短施工时段，减少扰动时间，减少水土流失发生的可能性；工程设计较为明确，基本满足《生产建设项目水土保持技术标准》规定的要求。

3.6 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

1、不同水土流失类型区的特殊性规定评价

本项目位于安徽省郎溪县郎溪经济开发区，水土保持区划属南方红壤区，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），对本项目主体工程不同水土流失类型区的特殊规定分析和评价详见表 3.6-1，**城市区域特殊规定分析和评价见表 3.6-2。**

表 3.6-1 不同水土流失类型区特殊规定水土保持评价

序号	不同水土流失类型区的特殊规定		本工程	评价
1	南方红壤区	坡面应布设径流排导工程，防治引发崩岗、滑坡等灾害	不涉及	/
2		针对暴雨、台风特点，应采取应急防护措施	本项目主体设计有临时彩条布苫盖，可有效防止在极端天气里造成水土流失	符合要求

表 3.6-2 城市区域特殊规定分析和评价见表

序号	不同水土流失类型区的特殊规定		本工程	评价
1	应采用下凹式绿地和透水材料铺装地面等措施，增加降水入渗。		采用下凹式绿地，增加降水入渗。	满足要求
2	应综合利用地表径流，设置蓄水池等雨洪利用和调蓄措施。		本项目已设计雨水管网系统。应场地限制，不易设置蓄水池等，本方案未补充。	满足要求
3	临时堆土（料）应采取拦挡、苫盖、排水、沉沙等措施，运输渣、土的车辆车厢应遮盖，车轮应冲洗，防止产生扬尘和泥沙进入市政管网		主体对临时堆土场设计并实施了密目网布苫盖措施，以及临时排水沟和临时沉砂池等措施；本项目不涉及厂外渣、土运输，土方在厂区内流转。	满足要求
4	取土（石、砂）、弃土（石、渣）处置，宜与其他建设项目统筹考虑。		本工程不涉及取土（石、渣），无弃土。	满足要求

2、主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

根据主体设计文件及现场调查，主体工程设计中具有水土保持功能工程主要包括雨水管网、土地整治、综合绿化、彩条布苫盖等，分析如下：

(1) 雨水管网

本工程采用有组织排水，经室外雨水口收集后通过厂区雨水管网排入室外市政雨水管网。主体工程设计在道路两侧布设排水管道，排导项目区内的汇水，主体工程区设排水管线 3988m（仅包含本次项目防治责任范围，3#、4#车间本次项目未计划建设，其雨水管网 940m 未计入）。采用钢筋混凝土圆管，环刚度为 SN8；雨水管径 DN300、DN400、DN500，雨水口连接管管径 DN225、DN300。

水土保持评价：项目区雨水管的布设可以有效的排导雨水，保护项目区的环境，具有水土保持功能。

(2) 土地整治

本项目在施工后期对可绿化区域及施工临建区未硬化部分实施土地整治，土地整治面积为 0.6389hm²，土地治可有效减少土壤侵蚀减少水土流失，具有良好的水土保持功能；

水土保持评价：土地整治可有效减少土壤侵蚀减少水土流失，具有良好的水土保持功能。

(3) 综合绿化：项目建设对区域内建筑物及道路周边空地进行景观绿化，景观绿化面积 0.4856hm²。

水土保持评价：绿化可改善项目区环境，减少裸露面。具有较好的水土保持功能，纳入水土保持措施，计入水土保持投资。

(4) 彩条布苫盖：施工期间，主体设计对裸露地面、开挖基坑边坡、临时堆土场等采取彩条布苫盖，共计 0.08hm²。

(5) 沉砂池：为降低排水泥沙含量，本方案在布设沉沙池 1 座，用来沉淀车辆清洁池中的泥沙，沉砂池选用矩形断面，1.0m×1.0m×1.0m（长×宽×深），采用 0.12m 厚砖砌，表面为 0.02m 厚砂浆抹面。沉砂池主要工程量为土方开挖 20m³。施工期间应定期对沉沙池进行清理，将清理出的泥沙回填至项目区场地，施工结束后将沉沙池回填。

(6) 临时排水沟：本方案在临时堆土场、厂区南部靠道路布设 426m 的临时排水沟。排水沟为土质结构，采用上底为 60cm，下底为 20cm，深 30cm 的梯形断面。设计坡降 2.0%，临时排水沟设计参照建构筑物区临时排水沟设计，将项目区的径流汇集至沉砂池，经沉砂池沉淀后，与项目区外排市政雨水管网相连。

(7)

以上措施能有效防止项目建设带来的水土流失，具有水土保持功能，但还不够全面，远期需要加强厂区绿化维护，以减少该区域的水土流失。

3.7 主体工程设计中水土保持措施界定

3.7.1 水土保持措施界定原则

- 1、应将主体工程设计中以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施。
- 2、难以区分是否以水土保持功能为主的工程，可按破坏性试验的原则进行界定，即假定没有这些工程，主体设计功能仍然可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，此类工程应界定为水土保持措施。

3.7.2 主体设计中界定为水土保持措施汇总

综合以上分析，主体设计中界定为水土保持措施工程量及投资见表 3.7-1。

表 3.7-1 主体设计中界定为水土保持措施工程量及投资汇总表

分区	措施类型		单位	总计		已完成	
				工程量	投资（万元）	工程量	投资（万元）
主体工程区	工程措施	雨水管网	m	3988.00	65.80	0.00	0.00
		土地整治	hm ²	0.49	0.64	0.84	1.11
	植物措施	综合绿化	hm ²	0.49	36.42	0.00	0.00
	临时措施	彩条布苫盖	hm ²	0.08	0.40	0.04	0.20
		临水排水沟	m	426.00	0.85	73.00	0.15
		临时沉砂池	个	1.00	0.10	1.00	0.10
施工 临时区	工程措施	土地整治	hm ²	0.15	0.20		
	临时措施	播撒草籽	kg	3.6	0.005	0.00	0.00
合计		/	/	/	104.42	/	1.56

4 水土流失分析与预测

4.1 调查及预测单元和时段

1、调查及预测单元

根据本项目实际建设特点，确定水土流失的预测单元划分为主体工程区和施工临建区。按照施工进度各调查单元各阶段水土流失面积情况见下表。

表 4.1-1 工程水土流失调查单元表

调查单元	调查面积	建设特点及侵蚀机理	侵蚀形式
施工期（调查及预测）			
主体工程区	5.9906hm ²	基础开挖，破坏地表，形成新的疏松裸露面	基础开挖可能产生轻度～中度侵蚀
施工临建区	0.1533hm ²	未硬化区域地表裸露	地表裸露，轻度侵蚀
自然恢复期			
主体工程区	0.4856hm ²	工程结束后，除建筑物与硬化场地外的绿化地区尚未发挥效益	以面蚀为主，轻度侵蚀

2、预测时段

按照《生产建设项目水土保持技术标准》规定，水土流失预测时段分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段。

各预测单元施工期和自然恢复期应根据施工进度分别确定，对不同的区域采取不同的预测时段，施工期为实际扰动地表时间；自然恢复期为施工扰动结束后，

不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间，应根据当地自然条件确定，一般情况下湿润区取 2 年，故本方案水土流失预测自然恢复期取 2.0 年。

施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计；不足 12 个月，但达到一个雨季长度的（本项目区雨季为 6～9，历时 4 个月），按一年计；不足一个雨季长度的，按占雨季长度的比例计算。

本工程已于 2022 年 4 月开工，预计 2023 年 3 月完工，工期 12 个月。

表 4.1-2 工程预测时段表

阶段	预测分区（单元）	预测时段（年）	水土流失因素
施工期	主体工程区	1	基础开挖等施工过程
	施工临建区	1	建筑施工材料堆放，地表裸露
自然恢复期	主体工程区	2	绿化工程尚未发挥效能

3、土壤侵蚀模数

（1）土壤侵蚀背景值

按照水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），宣城市郎溪县土壤

侵蚀类型为南方红壤区，土壤侵蚀容许流失量按 $500\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$ 。依据主体工程设计资料，在收集本工程所在地区水土流失状况、气象水文资料及周边类似工程的水土流失监测等资料的基础上，开展外业调查工作。根据《土壤侵蚀分类分级标准》确定整个项目区土壤侵蚀模数背景值为 $450\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$ 。

(2) 扰动后侵蚀模数

项目施工期土壤侵蚀模数取 $2600\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$ ，自然恢复期土壤侵蚀模数取 $780\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$ 。

表 4.1-3 扰动后土壤侵蚀模数取值表

防治分区及测算单元	类比工程相似单元	扰动后侵蚀模数取值 ($\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$)	
		施工期	自然恢复期
主体工程区	主体工程区	2600	780

4.2 土壤流失量的调查与预测

4.2.1 已发生水土流失量调查

1、调查单元

根据本项目实际建设特点，确定水土流失的调查单元划分为主体工程区 1 个单元。

2、调查单元面积及土壤侵蚀模数

本工程已于 2022 年 4 月开工建设，截止 2022 年 8 月，根据现场及遥感影像分析调查，结合现场地形地貌、防护措施落实情况等，可确定主体工程区、施工临建区的侵蚀模数。

表 4.2-1 各调查单元水土流失面积及侵蚀模数统计表

扰动单元	平均土壤侵蚀强度 $\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$	侵蚀时间 (a)
主体工程区	2600	0.8
施工临建区	2600	0.8

3、已产生水土流失量调查结果

根据各分区、各阶段水土流失调查时段、水土流失面积、扰动后土壤侵蚀模数估算已发生阶段的水土流失量。根据估算结果，已产生的水土流失总量为 67.09t ，其中背景水土流失量 11.61t ，其中新增水土流失量 55.48t 。

已产生水土流失量调查结果见表 4.2-2。

表 4.2-2 项目前期已产生的水土流失量调查表

调查单元	施工时段	扰动面积 (hm ²)	调查时段 (a)	原地貌土壤侵蚀模数 (t/(km ² ·a))	扰动后土壤侵蚀模数 (t/(km ² ·a))	水土流失总量 (t)	背景水土流失量 (t)	新增水土流失量 (t)
主体工程区	2022.4-2022.8	5.9906	0.8	450	2600	124.60	21.57	103.04
施工临建区	2022.4-2022.8	0.1533	0.8	450	2600	3.19	0.55	2.64
合计	/	6.1439	/	/	/	127.79	22.12	105.68

4.2.2 可能产生水土流失量预测

1、预测单元

按照施工进度各预测单元各阶段水土流失面积情况见下表。

表 4.2-3 各预测单元各阶段水土流失面积一览表 单位: hm²

序号	预测单元	预测面积 (hm ²)	
/	/	施工期	自然恢复期
1	主体工程区	5.9906	0.4856
	施工临建区	0.1533	0.1263
合计	/	6.1439	0.6119

2、预测时段

按照《生产建设项目水土保持技术标准》规定,水土流失预测时段分为施工期(含施工准备期)和自然恢复期两个时段。具体预测时段见表 4.2-4。

表 4.2-4 工程预测时段表

预测单元	施工期预测时段 (a)		自然恢复期预测时段 (a)	
主体工程区	2022.9-2023.3	0.58	2023.4-2025.5	2
施工临建区	2022.9-2023.3	0.58	2023.4-2025.5	2

3、预测结果

表 4.2-5 项目后期可能造成水土流失量预测成果表

预测时段	预测单元	面积 (hm ²)	扰动后侵蚀模数 (t/(km ² ·a))	侵蚀模数背景值 (t/(km ² ·a))	预测时段 (a)	预测流失总量 (t)	背景流失量 (t)	新增流失量 (t)
施工期	主体工程区	5.9906	2600	450	0.58	90.34	15.64	74.70

	施工临建区	0.1533	2600	450	0.58	2.31	0.40	1.91
自然恢复期	主体工程区	0.4856	780	450	2	7.58	4.37	3.20
	施工临建区	0.1263	780	450	2	1.97	1.14	0.83
总计		/	/	/	/	102.20	21.54	80.65

根据预测结果，本工程建设后期可能造成水土流失总量为 **102.20t**，其中背景水土流失量 **21.54t**，新增水土流失量为 **80.65t**。

4.2.3 水土流失量调查及预测结果汇总

根据调查及预测结果，本工程建设可能造成水土流失总量为 **229.99t**，背景水土流失量 **43.66t**，新增水土流失量为 **186.33t**。施工期为水土流失重点防治时段，主体工程区是水土流失防治的重点区域。

表 4.2-6 项目建设已（可能）造成水土流失总量

序号	时段	水土流失量 (t)		
		水土流失总量	背景水土流失量	新增水土流失量
1	已造成	127.79	22.12	105.68
2	后续可能造成	102.20	21.54	80.65
合计		229.99	43.66	186.33

4.3 水土流失危害分析

4.3.1 已造成的水土流失危害

根据查阅施工月报以及现场调查，主体工程区自 2022 年 4 月开工，截止 2022 年 8 月，根据现场勘查情况，项目施工期采取了临时排水沟、沉沙池、临时苫盖等水土保持措施，经调查，建设过程中未发生水土流失危害事件。

4.3.2 可能造成水土流失危害

项目区水土流失以水力侵蚀为主，结合当地水土流失及工程的施工特点，项目建设可能造成水土流失影响因素如下：

1) 工程扰动地表面积 6.1439hm^2 ，由于工程施工中对土壤造成扰动、破坏，降低了原有的水土保持功能，在自然因素和人为活动影响下，建筑物周围水土流失强度加大，水土流失危害加重。从预测结果显示，其可能造成水土流失量大，工程施工期是产生水土流失的主要时段。

2) 施工中大量施工人员和施工机械进入施工区，对项目区地表扰动和损坏，也是加剧水土流失的重要因素。

3) 临时堆料在堆放过程中受降雨和地面径流的影响, 易产生水土流失。

4) 对周边市政雨水管道的危害。工程建设过程中地表裸露、临时堆土若不采取及时有效的防护措施, 遇到降雨容易产生水土流失, 地表径流夹带的泥沙大量进入周边水系, 对周边河流造成不同程度的淤积。

5 水土保持措施

5.1 防治分区划分

5.1.1 分区依据

方案防治分区根据项目区的气候特点、地形地貌类型、新增水土流失的特点、项目主体工程布局及施工时序进行划分。同时，分区的划定遵循以下原则：

- 1) 各分区之间具有显著差异性；
- 2) 各分区内造成水土流失的主导因子相近或相似；
- 3) 分区应与地方水土保持规划中水土流失防治分区的划分相协调和一致；
- 4) 分区内建设时序、以及项目建设新增水土流失特点相似。

5.1.2 防治区划分

采用实地调查、资料收集与数据分析相结合的方法进行水土流失分区。根据主体工程布局、施工工艺特点及造成水土流失的主导因子相近或相似的原则划分水土流失防治分区，本项目水土流失防治分区划分为主体工程区和施工临建区 2 个防治分区。防治责任范围拐点坐标见下表 5.1-1

拐点编号	X	Y
J1	54357.3464	425328.2187
J2	54357.3464	425544.2187
J3	54207.1037	425573.4385
J4	54207.1037	425581.4385
J5	54198.1037	425583.4385
J6	54198.1037	425575.4385
J7	54118.0426	425591.5332
J8	54116.2729	425590.1272
J9	54108.8275	425493.3729
J10	54092.8275	425494.3729
J11	54091.8275	425485.3729
J12	54108.8275	425484.3729
J13	54096.8275	425317.3729
J14	54080.8275	425318.3729
J15	54078.8275	425286.3729
J16	54094.8275	425285.3729
J17	54085.8275	425158.3729
J18	54162.8275	425158.3729
J19	54153.8275	425187.3729
J20	54153.8275	425187.3729
J21	54154.3464	425382.2187

具体防治范围见表 5.1-2。

表 5.1-2 本项目水土流失防治区划分成果表

防治分区	面积 (hm ²)	水土流失特征	备注
主体工程区	5.9906	基础开挖与回填等施工开挖形成的大量裸露地表和松散土方, 施工对土壤扰动剧烈, 导致水蚀加剧等易引发水土流失。	包括项目区占地范围内建筑物、道路广场、绿化及永久出入口以及施工出入口临时占地, 总占地面积 5.9906hm ²
施工临建区	0.1533	工程建设开挖裸露地表, 受降雨冲刷和地表径流的影响, 极易产生水土流失。	位于项目红线内, 用于办公、堆放施工材料等用途, 占地面积约 0.1533hm ²
合计	6.1439	/	/

5.2 水土保持工程级别与设计标准

(1) 工程等级

根据主体设计, 植被恢复与建设工程等级为 1 级。

(2) 设计标准

根据主体设计, 主体工程区排水采用 10 年 1 遇短历时暴雨。


5.3 水土保持措施布设成果

在对主体工程中具有水土保持功能的防护措施进行分析评价的基础上, 结合防治分区的划分、不同单项工程建设的特点和主体已有的防治措施, 合理、全面、系统规划, 提出各防治分区水土流失防治措施体系。

本工程水土流失防治措施体系表详见表 5.3-1。

表 5.3-1 水土流失防治措施体系表 (*表示主体已有措施)

防治分区	水土保持措施		
	工程措施	植物措施	临时措施
主体工程区	土地整治* 雨水管网*	综合绿化*	彩条布苫盖* 临时排水沟* 临时沉砂池*
施工临建区	土地整治*	/	播撒草籽

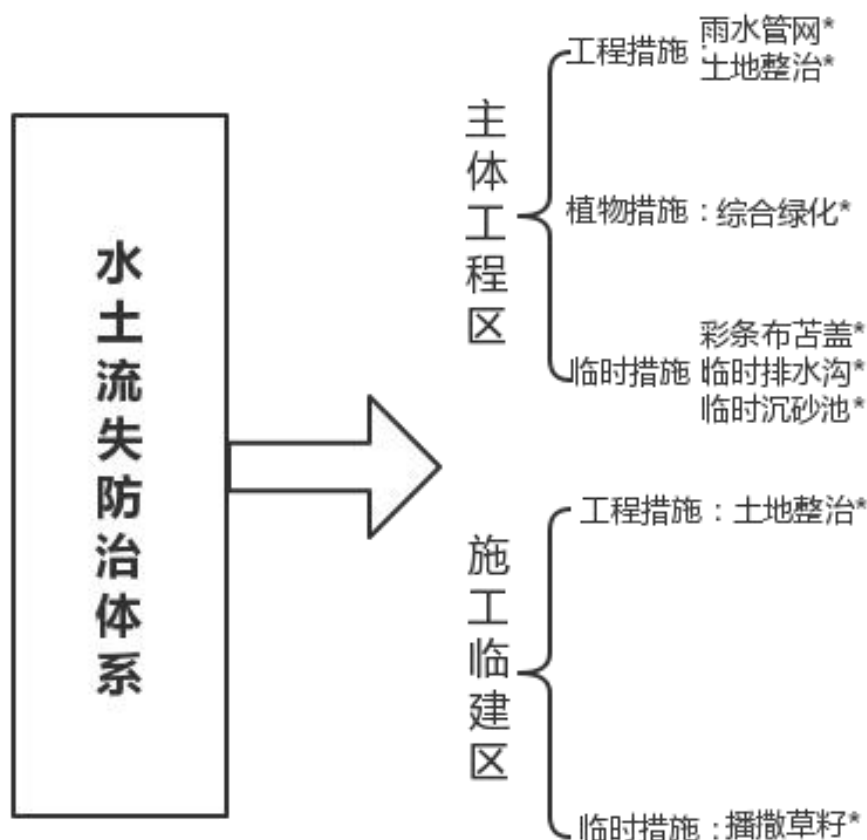

注：“*”表示主体设计中界定的水土保持措施

图 5.3-1 水土保持措施措施体系图

5.4 分区防治措施布设

5.4.1 主体工程区

（1）工程措施：

雨水管网：主体工程设计在道路两侧、建筑物周围埋设雨水管线，排导项目区内的汇水，排水管线长 3988m；

土地整治：本项目在施工后期对可绿化区域实施土地整治，土地整治面积为 0.4856hm²；

（2）植物措施：

综合绿化：主体设计在建构筑物周围、道路两侧等未硬化区域进行景观绿化，采用乔灌草结合的绿化方式，面积共计 0.4856hm²；

(3) 临时措施:

临时堆土彩条布苫盖约 0.08hm², 厂区南侧布置 426m 临时排水沟, 布设沉沙池 1 座。

5.4.2 施工临建区

(1) 土地整治: 本项目在施工后期对施工临建区未硬化部分拆除临建设施后实施土地整治, 土地整治面积为 0.1263hm²。

(2) 临时措施: 本项目施工临建区未硬化部分暂未计划建设, 在施工后期对施工临建区土地整治后播撒草籽, 面积为 0.1263hm²。

本项目水土保持措施量汇总表见表 5.4-1。

防治分区	措施类型	措施名称	单位	措施量
主体工程区	工程措施	★雨水管网	m	3988
		★土地整治	hm ²	0.4856
	植物措施	★景观绿化	hm ²	0.4856
	临时措施	★彩条布苫盖	hm ²	0.08
		★临时排水沟	m	426
		★临时沉砂池	座	1
施工临建区	工程措施	★土地整治	hm ²	0.1263 (0.027 已硬化)
	临时措施	★播撒草籽	hm ²	0.1263

注: ★表示主体已列措施。

5.5 水土保持措施施工进度安排

a) 施工进度安排原则

- 1) 与主体工程施工进度协调;
- 2) 临时措施应与主体工程同步实施;
- 3) 施工裸露场地应及时采取防护措施, 减少裸露时间;
- 4) 植物措施应根据生物学特征和气候条件合理安排。

b) 施工进度安排原则

本工程已于 2022 年 4 月开始施工, 计划于 2023 年 3 月完工, 总工期 12 个月, 水土保持工程实施进度计划见下表

时间 分区		2022 年									2023 年		
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
主体工程													
主体工程区	工程措施												
	植物措施												
	临时措施												
施工临建区	工程措施												
	临时措施												

6 投资概算与效益分析

6.1 投资概算

(1) 编制原则

1) 水土保持为主体工程的一部分，水土保持工程投资估算所采用的价格水平年、基本材料价格等与主体工程设计估算一致，并结合水土保持工程特点，不足部分参照《水土保持工程概（估）算编制规定》及《水土保持工程估算定额》的有关规定进行编制；

2) 对主体工程界定为水土保持措施的工程费用，计列入水土保持投资估算；

3) 主要材料价格及建筑工程单价与主体工程基本一致；

4) 植物工程单价依据当地价格水平确定；

(2) 编制依据

1) 《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水总[2003]67 号）；

2) 《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署 2019 年第 39 号）；

3) 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448 号）；

4) 《关于调整安徽省水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（皖水建函〔2019〕470 号）；

5) 《安徽省物价局 安徽省财政厅 安徽省水利厅关于我省水土保持补偿费收费标准的通知》（安徽省物价局安徽省财政厅 安徽省水利厅 皖价费〔2014〕160 号，2014 年 12 月 26 日）；

6) 《安徽省物价局 安徽省财政厅 转发国家发展改革委财政部关于降低电信网号码资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（安徽省物价局安徽省财政厅皖价费[2017]77 号，2017 年 7 月 4 日）；

7) 《安徽省发展改革委 安徽省财政厅 安徽省市场监管局关于降低部分收费标准的通知》（皖发改价费函【2022】127 号文件）

(3) 编制说明

①工程措施投资

工程措施费=工程量×单价；

②植物措施投资

植物措施费=工程量×单价（苗木、草、种子等材料费+种植费）；

③施工临时工程投资

临时防护工程费=临时措施工程量×单价；

其他临时工程：按第一和第二部分和的 2%计算。

④独立费用

独立费用=项目建设管理费+水土保持监理费+科研勘测设计费+水土保持监测费+水土保持设施验+报告编制费；

A、建设管理费：取一至三部分之和的 2%，并结合主体工程建设单位管理费合并使用由于本项目已开工，可不用计列。

B、水土保持监理费：按国家发展改革委〔2015〕发改价格 299 号文发布的《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》及中国建设监理协会〔2015〕52 号发出《关于指导监理企业规范价格行为和自觉维护市场秩序的通知》，并按实际情况调整实际工作量核实计算。

C、科研勘测设计费：根据项目实际情况，本项目已开工，可不计列科研勘测设计费。

D、水土保持方案编制费按照合同价计列。

E、水土保持专项设施验收费：按实施工作量计列。

⑤基本预备费

因本项目已开工，不计列基本预备费。

⑥水土保持补偿费

根据《安徽省物价局 安徽省财政厅 安徽省水利厅关于我省水土保持补偿费收费标准的通知》（安徽省物价局 安徽省财政厅 安徽省水利厅 皖价费〔2014〕160 号，2014 年 12 月 26 日）、《安徽省物价局 安徽省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网号码资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（安徽省物价局安徽省财政厅皖价费〔2017〕77 号，2017 年 7 月 4 日）和《安徽省水土保持补偿费征收使用管理办法》，本项目共计占地 6.1439hm²，水土保持补偿费 6.1439 万元。

根据皖发改价费函【2022】127 号文件精神，水土保持补偿费自 2022 年 4

月 7 日起按 0.8 元/m² 计算。本项目共计占地 6.1439hm²，水土保持补偿费 4.91512 万元。

综合以上，本项目应缴为水土保持补偿费 4.91512 万元。

(4) 概算成果

本项目水土保持工程总投资 105.29 万元（其中主体已设计 95.79 万元，新增 9.5 万元），其中工程措施 58.40 万元，植物措施 36.75 万元，临时措施 0.65 万元，独立费用 5.00 万元，水土保持补偿费 4.91512 万元。

表 6.1-1 本项目水土保持投资概算总表 单位：万元

序号	工程或费用名称	新增水土保持投资						主体已列	总计
		建安工程费	植物措施费		设备费	独立费用	合计		
			载（种）植费	苗木草籽费					
第一部分 工程措施								66.65	66.65
一	主体工程区							66.44	66.44
	施工生产区							0.20	0.20
第二部分 植物措施								36.42	36.42
一	主体工程区							36.42	36.42
第三部分 临时措施								1.35	1.35
一	主体工程区							1.35	1.35
第一至第三部分合计								104.42	104.42
第四部分 独立费用						5	5		5
一	建设管理费					0	0		0
二	科研勘测设计费					0	0		0
三	水土保持监理费					0	0		0
四	水土保持监测费					0	0		0

五	水土保持设施验收费					2	2		2
六	水土保持方案编制费					3	3		3
第一至第四部分合计							5	104.42	109.42
基本预备费							0		0
水土保持补偿费							4.91512		4.91512
水土保持工程总投资							9.91512	104.42	114.33512

表 6.1-2 独立费用估算表

序号	工程或费用名称	单位	编制依据及计算公式	投资（万元）
1	水土保持设施验收费	万元	按实际合同额计列	2.00
2	水土保持方案编制费	万元	按实际合同额计列	3.00
合计		万元	/	5.00

表 6.1-3 水土保持补偿费计算表

行政区	收费依据	收费标准（元/m ² ）	占地面积（hm ² ）	计算结果（万元）	备注
宣城市郎溪县	水土保持补偿费：根据皖发改价费函【2022】127 号文件精神，水土保持补偿费按自 2022 年 4 月 7 日起按 0.8 元/m ² 计算	0.8	6.1439	4.91512	/

6.2 效益分析

本项目占地面积 6.1439hm²，项目区造成水土流失面积 6.1439hm²，工程建设将对所涉及的区域采取相应的水土流失治理措施，各项措施实施之后，水土流失治理面积包括工程实施的工程措施面积、植物措施面积，共计 6.1439hm²。项目建设区采取的水土保持措施面积见表 6.2-1。

表 6.2-1 设计水平年各防治分区采取水土保持措施 单位：hm²

防治分区	防治责任范围	水土流失面积	水土流失治理达标面积			
	（hm ² ）	（hm ² ）	植物措施	工程措施	建筑物占压及硬化部分	合计
主体工程区	5.9906	5.9906	0.4856	0	5.505	5.9906

施工临建区	0.1533	0.1533	0	0.1263	0.027	0.1533
合计	6.1439	6.1439	0.4856	0	5.6583	6.1439

本工程各防治分区实施水土保持工程措施和植物措施以及临时措施后，至方案设计水平年，项目区的防治指标预测值均能达到目标值，实现了预期的防治效果。设计水平年项目区水土流失防治指标分析汇总详见表 6.2-2。

表 6.2-2 设计水平年工程六项指标综合目标值分析汇总表

评估指标	目标值 (%)	评估依据	单位	数量	预测达到值 (%)	评估结果	
水土流失总治理度 (%)	98	水土流失治理达标面积	hm ²	6.1439	99.9	达标	
		项目水土流失防治责任范围	hm ²	6.1439			
土壤流失控制比	1.10	项目区容许土壤流失量	t/km ² ·a	500	1.11	达标	
		方案实施后年平均土壤流失量	t/km ² ·a	450			
渣土防护率 (%)	98	采取措施实际挡护的永久和临时堆土量	万 m ³	0.792	99	达标	
		永久和临时堆土总量	万 m ³	0.8			
表土保护率	/	保护的表土数量	万 m ³	/	/	/	
		可剥离表土总量	万 m ³	/			
林草植被恢复率 (%)	98	林草类植被面积	hm ²	0.4856	99.9	达标	
		可恢复林草植被面积	hm ²	0.4860			
林草覆盖率 (%)	5	林草类植被面积	hm ²	0.4856	8	达标	
		防治责任范围	hm ²	6.1439			

至设计水平年，本工程各项水土保持措施实施之后，这项指标预测值均能答案到达到防治目标，其中水土流失治理度 99.9%；土壤流失控制比 1.11；林草植被恢复率 99.9%；渣土防护率 99%；林草覆盖率 8%。本工程建设期水土流失总面积 6.1439hm²，水土流失治理达标面积 6.1439hm²，林草植被建设面积 0.4856hm²。

7 水土保持工程管理

7.1 组织管理

建设项目的水土保持设施，应该与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，项目业主应专门成立水土保持方案实施管理机构，配置专职人员负责水土保持工作的组织、管理和落实，并与地方水土保持部门取得联系，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。

7.2 后续设计

本项目水土保持方案范围仅为一期工程，后期工程建设前需另编制水土保持方案，并履行相关手续。

7.3 水土保持监测

本项目为报告表项目，根据新的政策，水土保持监测不做要求。

7.4 水土保持监理

与主体工程一道进行监理，不单独开展监理。

7.5 水土保持施工

纳入本方案的水土保持工程由承担本工程施工的单位负责施工，在施工合同中明确施工责任。

7.6 水土保持验收

水土保持工程施工结束，根据《关于省级生产建设项目水土保持方案编制和设施验收有关工作的通知》（皖水保函[2016]487号，2016，4，25）、《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（安徽省水利厅皖水保函【2018】569号，2018年4月8日）、水利部《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部水保[2019]160号，2019年5月31日）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号，2019年7月30日）的要求，组织验收，并报郎溪县水利局备案。
